

Stand van zaken en organisatie besluitvorming winning Kruisland

22 november 2024

**Bewust.
Natuurlijk.**

Concept 20 november

brabant **Water**

Besluitvormingsproces voor de winning: context


- De besluitvorming voor de winning, die op basis van een bestuursakkoord tussen de provincie en Brabant Water in gang is gezet, betreft met name
 - een vergunning voor de grondwateronttrekking (provincie),
 - een vergunning voor de bronbemaling (waterschap) en
 - een Bopa (gemeente Steenbergen).
 - Daarnaast nog een lijstje vergunningen voor de aanleg, zie laatste sheet uit het concept MER (nu niet aan de orde)
- Het project leek eerste vrij eenvoudig tot stand te kunnen komen, met brede consensus en weinig weerstanden. De context is, zowel qua problematiek in gebieden als de politiek, snel ingewikkelder geworden
- Het is nu duidelijk dat afstemming (minimaal) en/of samenwerking (maximaal) nodig is tussen Brabant Water en de bevoegde gezagen, om het proces tot een goed einde te brengen
- Er is geen uitgewerkt procesplan en organisatie- of governance-structuur voor een gecoördineerde besluitvorming
- Er is nog gesprek over de rol die de provincie eventueel op zich zou willen nemen voor de coördinatie van de besluitvorming: dat kan zeer minimaal zijn, tot een coördinatie-rol of regeling, tot een projectbesluit.
- Het waterschap was lang afwachtend, met een toetsende houding. Inmiddels is zij zich bewust dat zij meer zicht moeten krijgen op hun watersysteem gezien meerdere knelpunten èn deze winning. Zij willen nu meer samenwerken, verwijzend naar het grondwaterconvenant.
- De gemeente Steenbergen is onzeker, ook gezien de politieke krachten in de raad en de gemeente en heeft nog weinig informatie ontvangen. Zij vragen zich af of zij een Bopa kunnen/willen realiseren en kijkt naar de provincie voor een projectbesluit
- Belangrijk aanknopingspunt: de omgeving. Lobby vanuit landbouw en natuurorganisaties en BMF

**Bewust.
Natuurlijk.**

Concept 20 november

brabant Water

Het proces in theorie bij coördinatie van besluitvorming

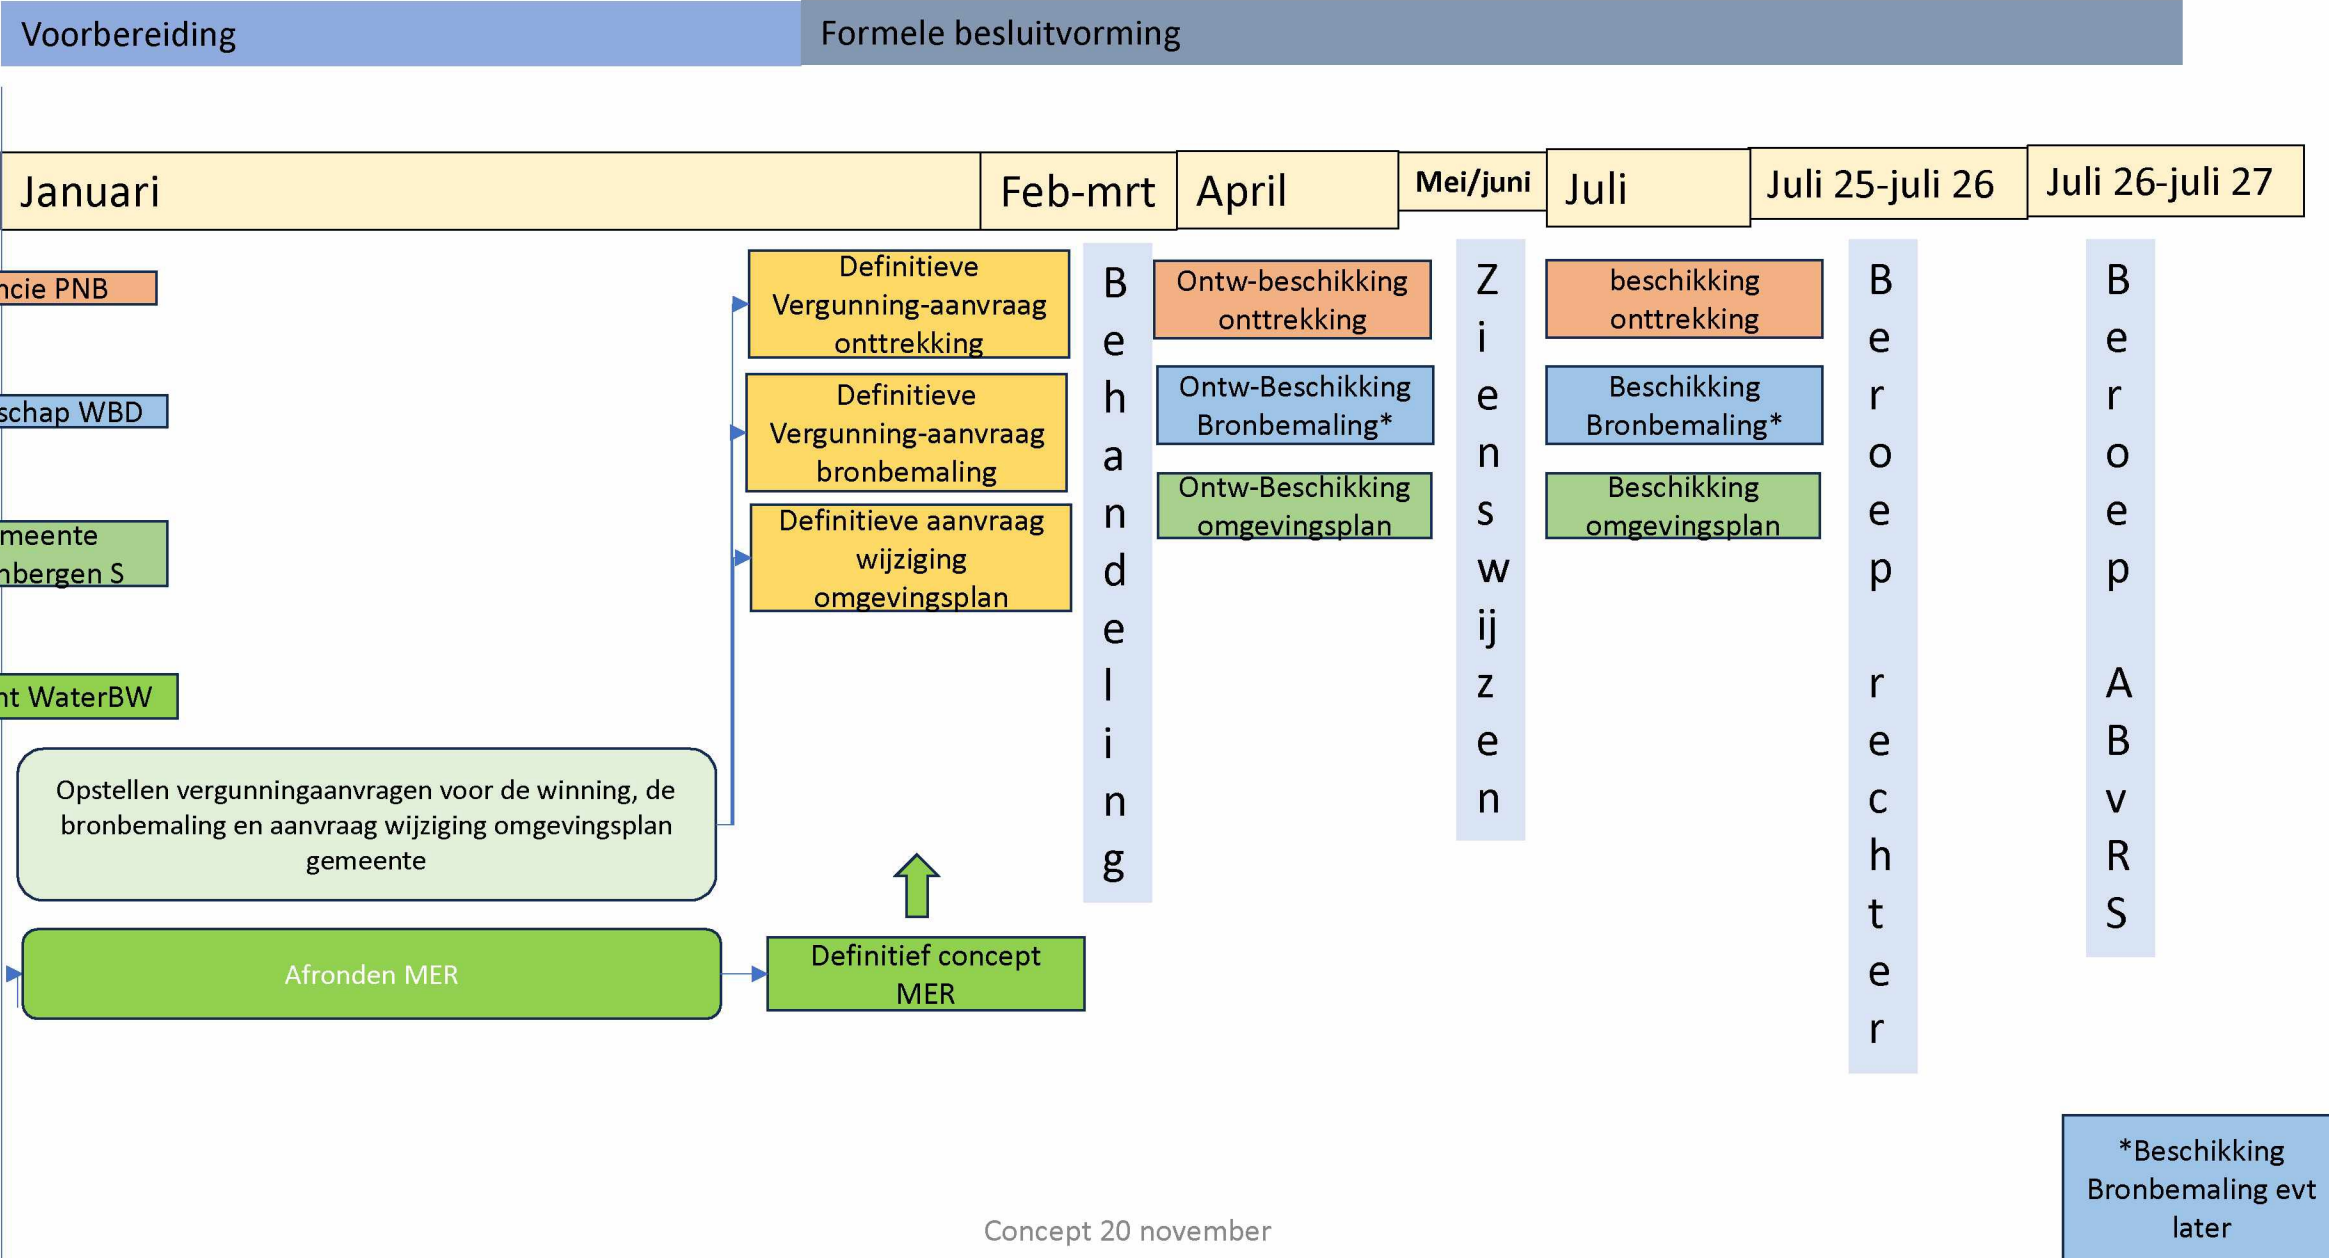

Stand van zaken mbt het MER

MER

- Het proces rondom de MER was in eerste instantie eenvoudig, waarbij opzet MER, methodiek en criteria niet met de bevoegde gezagen zijn besproken en bijvoorbeeld geen gezamenlijke effectbeoordeling of bespreking heeft plaatsgevonden. geëvolueerd en onduidelijk: Er zijn veel vragen opgehaald in een review, zonder duidelijke deadline en discussies worden beïnvloed door onduidelijkheid en onzekerheid in de context
- Gaandeweg is de afstemming en het gesprek alleen over de band van het MER gegaan, waardoor MER als 'duizend dingen doekje' heeft gefungeerd: De besluitvorming lijkt over het MER te gaan, terwijl de MER een onafhankelijk, beslisondersteunend document is voor een besluitvormingsprocedure. Dat laatste is leidend en complex gezien de onzekerheden en conflicterende belangen.
- Het MER is grotendeels gereed en de effecten zijn bijna allemaal berekend. Belangrijkste zijn nog:
 - Zettingen
 - Effecten op natuur en landbouw vanwege grondwaterstandsdeling:
 - In combinatie met andere knelpunten en onzekerheden in het watersysteem: dit kan ^{5.1.2e} delen vertaald worden in het MER, maar vraagt een bredere aanpak in het kader van het grondwaterconvenant
 - Nader inzoomen op de effecten op natuur en landbouw
- Het gesprek met het waterschap is inmiddels geïntensiveerd, maar vraagt nog aandacht

Mogelijke routes voor Brabant Water

Huidige situatie:

Geen helderheid over besluitvormingsprocedure en coördinatie daarop



Snel het proces verduidelijken

•Afspraken met provincie



•bevoegd gezag overleg hernieuwd proces



Gezamenlijk hernieuwd proces

Mogelijke routes voor Brabant Water

Huidige situatie:
Geen helderheid over besluitvormingsprocedure en coördinatie daarop

Snel het proces verduidelijken

- Afspraken met provincie
- bevoegd gezag overleg hernieuwd proces
- Gezamenlijk hernieuwd proces

situatie 1:
Geen projectbesluit, met **2A**: wel coördinerende rol provincie of niet


Optie 1: Aanvragen vergunningen indienen

- MER in concept afmaken
- Vorbereiden aanvraag bij OD, WBD en gemeente
- 2A** Coördinatie proces olv provincie
- Indienen aanvragen bij OD, WBD en gemeente, incl MER


Leidt mogelijk tot 'boemerang': gemeente weigert medewerking, waarna opties opnieuw moeten worden afgewogen en een projectbesluit reëler wordt,

Mogelijke routes voor Brabant Water

Huidige situatie:
Geen helderheid over besluitvormingsprocedure en coördinatie daarop




situatie 1:
Geen projectbesluit, met **2A**: wel coördinerende rol provincie of niet

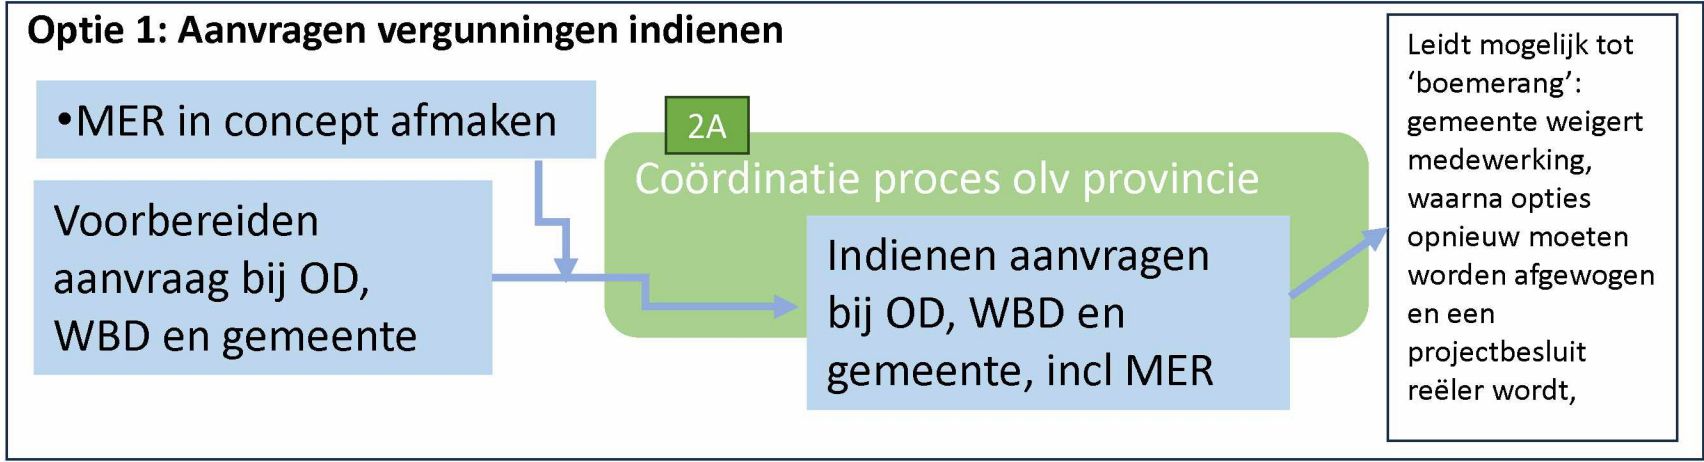

situatie 2 :
Wel projectbesluit

Belangrijk aandachtspunt in alle situaties: het omgevingsmanagement

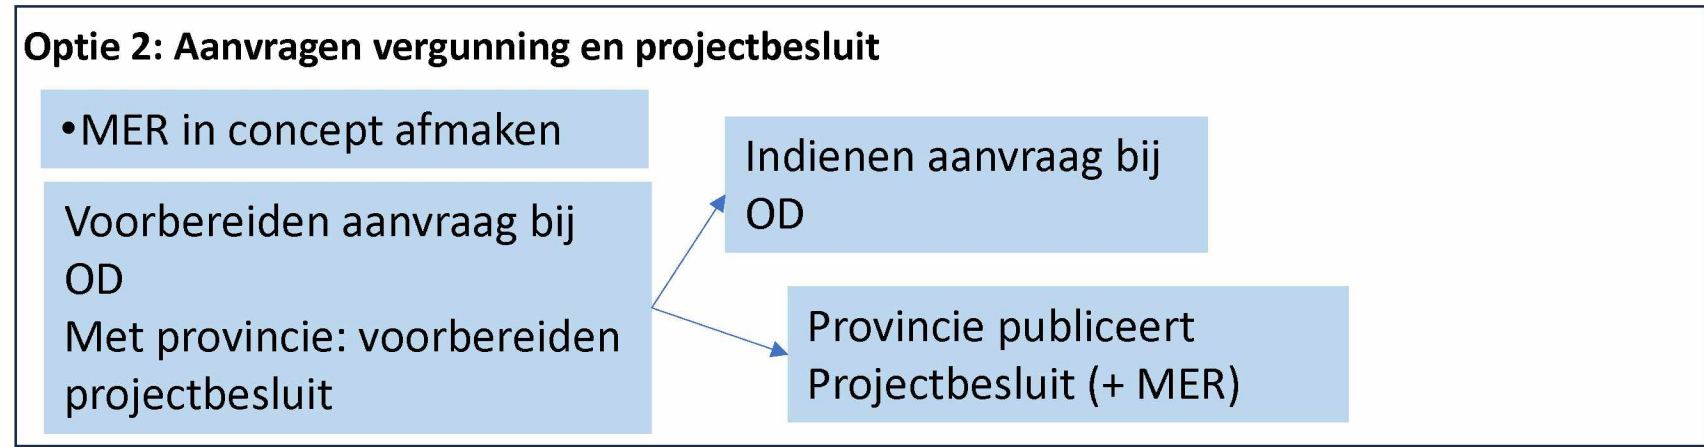

Inzoomen op voorbereidende verduidelijking besluitvormingsproces, waarbij een projectbesluit niet aan de orde is, maar wel coördinatie (2A)

2024

Begin 2025 (?)

Overleg BW en provincie (5.1.2e en 5.1.2e):

- Geen projectbesluit
- Procesvoorstel akkoord
- Rol coördinerend bevoegd gezag

Overleg BW en bevoegde gezagen:

- Eens over proces
- Wat heeft ieder nodig
- Coördinatie en overlegstructuur

Gemeente ziet zich niet in staat tot ruimtelijk besluit: provincie en BW opnieuw in overleg

Bevoegde gezagen zijn akkoord, proces start

Vooroverleg bij BW: 13 nov

Vooroverleg ambtelijk prov/BW: 22 nov

Ontbrekende informatie en commentaren: Antea, WS (?), RHDHV, provincie

Overleg WS en provincie over Hydrologie en effecten totaal: wat hoort bij het MER

Overleg Gemeente over effecten

MER in concept afmaken

Effecten compleet en bekend

Vorbereiden aanvraag vergunning en ruimtelijk besluit

Informatie voor besluit bekend

Voorstel governance en organisatie

Bestuurlijk overleg:
 Gedeputeerde: Saskia Boelema
 Dijkgraaf : 5.1.2.e
 Wethouder : 5.1.2.e
 BW : 5.1.2.e

Management overleg

Provincie: (vz)

WS: 5.1.2.e

OD: ??

BW: 5.1.2.e / 5.1.2.e

Steenbergen:

Ambtelijke werkgroep

Provincie: (vz)

WS: 5.1.2.e (?)

OD: 5.1.2.e

BW: 5.1.2.e

Steenbergen: 5.1.2.e / 5.1.2.e

Opdrachtgever
 Kruisland: 5.1.2.e

5.1.2.e
 Kruisland: 5.1.2.e

Projectteam BW

5.1.2.e
 Kruisland: 5.1.2.e

5.1.2.e

IB/ communicatie etc

5.1.2.e en 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

RHDHV: MER

RPS: aanvragen

Ter info: benodigde besluiten, uit het concept MER

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit	Provincie Noord-Brabant	Grondwateronttrekking voor de openbare drinkwatervoorziening	Mer-beoordelingsplichtig
Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit	Waterschap Brabantse Delta	Bronbemaling (en eventuele lozing) voor de aanleg van de transportleiding	Mer-beoordelingsplichtig
<u>Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit</u>	<u>Waterschap Brabantse Delta</u>	<u>Bronbemaling (en eventuele lozing) voor de aanleg van het gebouw:</u>	<u>Mer-beoordelingsplichtig</u>
Aanpassing provinciale omgevingsverordening	Provincie Noord-Brabant	Aanwijzen beschermingszone waarna voor dit gebied de regels uit de provinciale verordening gelden	
Omgevingsvergunning afwijken omgevingsplan ("Bopa")	Gemeente Steenbergen	Waterwinning en de realisatie gebouw met hekwerk is niet toegestaan binnen de huidige planologische enkelbestemming "agrarisch met waarden – landschapswaarden" van het omgevingsplan (bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen)	
Omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit ("technische bouwactiviteit")	Gemeente Steenbergen	Realisatie gebouw met hekwerk op de winlocatie	
Omgevingsvergunning voor een uitwegactiviteit	Gemeente Steenbergen	Realisatie in-/uitrit naar de winlocatie	
Omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit	Gemeente Steenbergen	Aanleg- en boorwerkzaamheden op de winlocatie (voor hekwerk)	
Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit ("ruimtelijke bouwactiviteit") (mogelijk)	Gemeente Steenbergen of Roosendaal afhankelijk van de locatie	Aanleg transportleiding	
Omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit ("technische bouwactiviteit")	Gemeente Steenbergen of Roosendaal afhankelijk van de locatie	Aanleg transportleiding	
Omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit	Gemeente Steenbergen of Roosendaal afhankelijk van de locatie	Aanleg transportleiding	
Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (mogelijk)	Waterschap Brabantse Delta	Aanleg transportleiding voor zover die waterstaatswerken raakt waarvoor vergunningplicht geldt	
Omgevingsvergunning voor een natuuractiviteit ("Natura 2000-activiteit" en/of <small>5.1.2.e</small> en fauna-activiteit" (mogelijk)	Provincie Noord-Brabant	Verstoring soorten bij aanlegwerkzaamheden winlocatie of transportleiding	

Omgevingsmanagement Kruisland


Strategische samenwerkingen (West-)Brabant → Buiten project Kruisland

Stakeholdermanagement

- Beleidsniveau
- Bevoegd gezagen
- Relatie/omwonenden

→ In project Kruisland

Omgevingscommunicatie

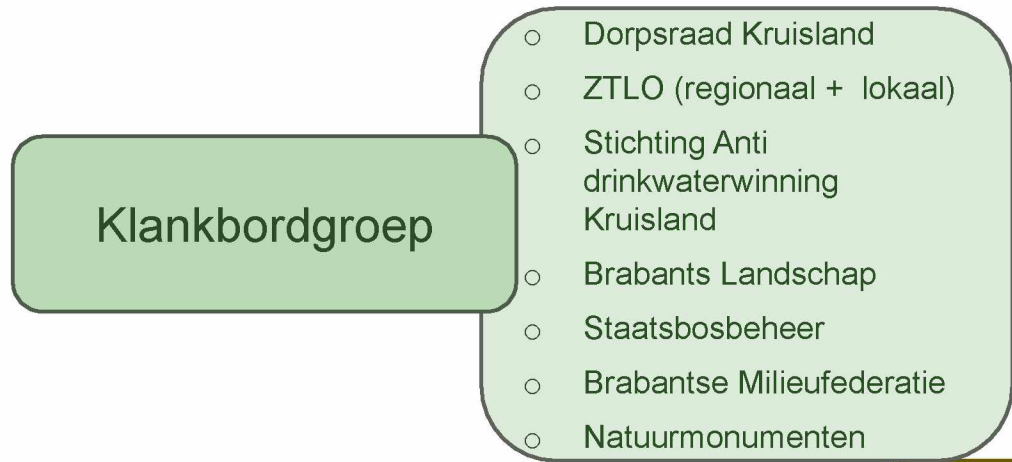


Overleggen

- Klankbordgroep, daarnaast apart met
- Natuurorganisaties
- Besturen landbouw
- Bevoegd gezagen
- 1-op-1 relatiemanagement

Middelen media

- Informatieartikelen projectpagina
- Nieuwsbrief project
- Advertenties Het Pompke

**Bewust.
Natuurlijk.**

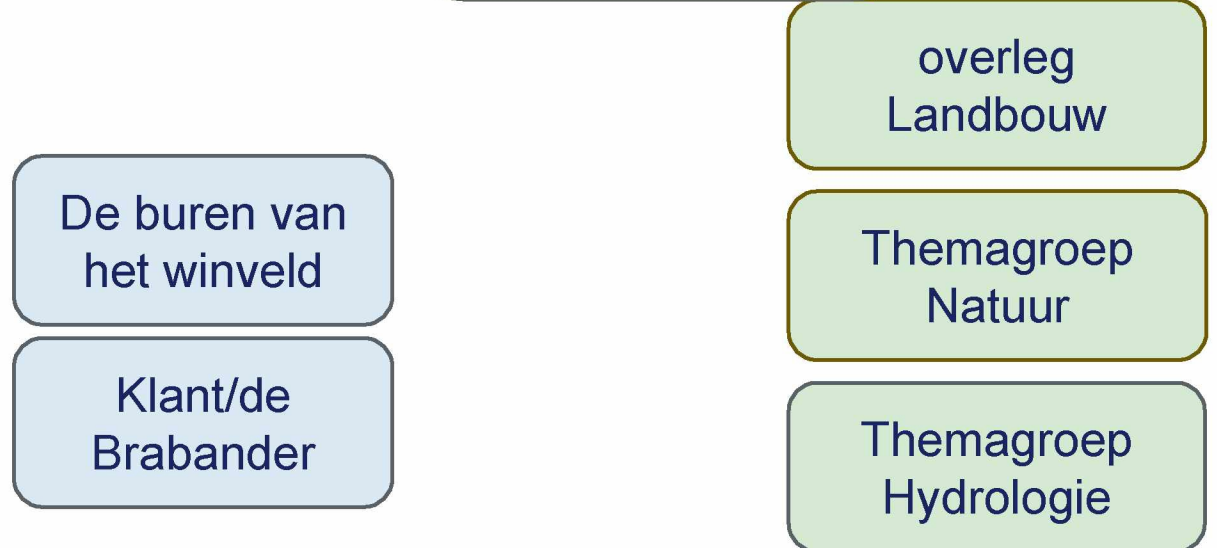

Planning omgevingsproces

