

Notitie

Aan : Regiegroep en Energietafel Energieregio NOB
Van : Programmteam Energieregio NOB
Onderwerp : Koers en ambitie Energieregio Noordoost-Brabant
Datum : 28 januari 2026
Bijlage(n) : **Bijlage 3.3_Tabel gemeenten energiebod- LN 23-10-2025**

Samenvatting

De Energieregio NOB kan het gezamenlijke doel van minimaal 1,6 TWh duurzame opwek halen. Gezien de actuele knelpunten (stikstof, netcongestie, ruimte) is realisatie waarschijnlijk 2–3 jaar later dan 2030. Met gerichte prioritering van kansrijke projecten en versterkte regionale samenwerking volgens de BOB-methodiek zetten we projecten van “ambitie” naar “pijplijn” en versnellen we uitvoering.

- Herijk de portefeuille: focus op haalbare en kansrijke projecten, inclusief herbeoordeling van ijskastprojecten.
- Werk regionaal samen: prioriteer wind- en zoninitiatieven in relatie tot het te halen RESbod 2021. En kom gezamenlijk, met gemeenten, provincie en waterschappen tot snelle vergunningverlening.
- Versnel besluitvorming: werk gestructureerd via Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming (BOB).
- Stuur bestuurlijk op 2030-doel met zicht op 2032–2033 voor volledige realisatie, en bouw door richting 2050.

Aanleiding

De voortgangsrapportage laat zien dat NOB op koers ligt voor grootschalige opwek, mits ambitieprojecten worden behaald. Recent zijn enkele lokale projecten stopgezet om uiteenlopende redenen. Daarom is een regio-brede inventarisatie gemaakt van “ijskastprojecten”: initiatieven voor grootschalige opwek die geen doorgang vonden. Doel: vaststellen welke projecten alsnog kansrijk zijn en gericht aandacht verdienen.

Doel en uitgangspunten

RES-doelstelling: minimaal 1,6 TWh duurzame opwek in 2030 voor Noordoost-Brabant. In 2021 is afgesproken dat gemeenten eigenaarschap nemen over hun deel van de opgave. De doelstelling voor 2050 valt buiten deze notitie.

Context en uitdagingen


De werkelijkheid van 2026 verschilt van die in 2021. Knelpunten rond stikstof, netcongestie en ruimte zijn toegenomen. Vergunningstrajecten zijn niet overal afgerond per 1 januari 2025. Desondanks ligt NOB inhoudelijk op koers om 1,6 TWh te halen, zij het 2–3 jaar later.

Projectniveaus en prioritering

Hoe gaan we het doel behalen? We onderscheiden drie niveaus: ijskast-, ambitie- en pijplijnprojecten. Op basis van de inventarisatie kunnen ambitie- en pijplijnportefeuilles positief worden bijgesteld. Onderstaande infografiek visualiseert de beweging van projecten door de pijplijn.

Categorie	Kenmerken	Actie
Ijskast	Projecten met belemmeringen (vergunning, netcapaciteit)	Herbeoordelen op haalbaarheid
Ambitie	Kansrijke projecten, verdere uitwerking nodig	Versnellen en prioriteren
Pijplijn	Gereed voor realisatie	Uitvoeren en monitoren

Afgelopen periode is een inventarisatie op de ambitie en ijskast projecten uitgevoerd (zie bijlage 3.3) waarin opgenomen een lijst met ijskastprojecten). Hierin is bij elke gemeente opgehaald welke projecten rondom grootschalige opwek, om welke reden dan ook; politiek/bestuurlijk, milieutechnisch of om praktische reden, tijdelijk in de “ijskast” zijn gezet. Ook is er gezamenlijk bekeken of deze projecten weer de ijskast uitkunnen. Omstandigheden kunnen veranderd zijn waardoor het wellicht nu wél mogelijk is om verder te werken aan dit project.

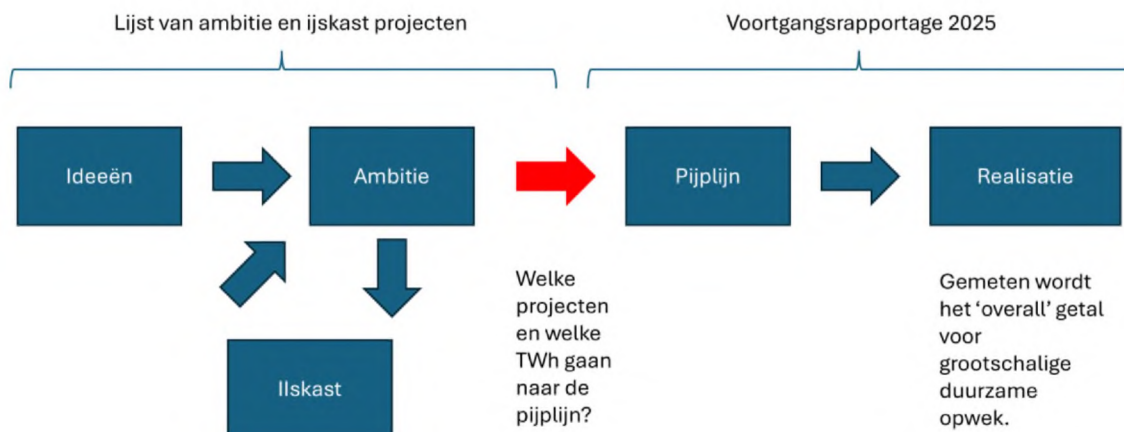

Toelichting; In de afbeelding is met de rode pijl aangegeven waar we nu staan. Dit is het moment waarop de keuze voor kansrijke projecten wordt gemaakt. En waar we dus ook gezamenlijk op in gaan zetten richting de pijplijn en uiteindelijk realisatie.

De algehele conclusie is dat er een aantal mogelijkheden zijn voor het positief bijstellen van de ambitie- en pijplijnprojecten. Zo kunnen we in Energieregio NOB toewerken naar een volledige invulling van de 1,6 TWh.

Naast de inventarisatie en het kritisch kijken naar de theoretische benadering van projecten, is ook een grote slag te halen op een ander vlak, namelijk gezamenlijk regionaal werken aan het RES-bod van 1.6 TWh. Hiertoe hebben we in 2024 al besloten.

Energietafel december 2024

Onze regionale aanpak en samenwerking gaat uit van collectieve consensus en een goede onderlinge samenwerking. De Energietafel (10 gemeenten, 2 waterschappen, provincie) heeft in december 2024 de doorstart van RES NOB bekrachtigd en gekozen voor de BOB-methodiek (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming). We richten ons op de meest kansrijke opties en helpen elkaar waar mogelijk



Zoals u begrijpt zal er een discrepantie gaan ontstaan tussen de afspraken in 2021 en de praktische uitwerking van vandaag. De ene gemeente zal simpelweg meer moeten doen omdat er meer gedaan kan

worden. Deze dilemma was al eerder in de RIB van februari 2023 benadrukt. Daarin hebben we ook uitgesproken dat we met elkaar in deze bestuursperiode toewerken naar een nieuwe samenwerkingsstrategie, met als belangrijke elementen; meer samenwerking op het gebied van personeel, het regionaal prioriteren van wind- en zoninitiatieven in relatie tot de beschikbare netwerkcapaciteit, het beter koppelen van onze duurzame opwek aan andere ruimtelijke opgaven en het regionaal aanhaken van maatschappelijke organisaties.

Huidige stand van zaken

De voortgangsrapportage 2025 en het wegvallen van enkele projecten onderstrepen het belang van samenwerking. Gemeenten moeten sterker sturen op afspraken en elkaar ondersteunen; daarbij dient de provincie actief te helpen bij het wegnemen van belemmeringen (vergunningen, netcapaciteit, ruimtelijke inpassing). We staan nu op het beslismoment om kansrijke projecten te selecteren en te versnellen richting pijplijn en realisatie.

Acties en randvoorwaarden

Om kansrijke projecten te selecteren en te versnellen richting pijplijn en realisatie kunnen de volgende acties en randvoorwaarden bijdragen:

1. Regionale prioritering van wind- en zonprojecten op basis van netcapaciteit en ruimtelijke inpassing.
2. Versnellen van vergunningverlening en juridische trajecten; waar nodig bestuurlijk escaleren.
3. Versterk het commitment en vertrouwen door een regio-brede versterking van de onderlinge samenwerking en de RES-opgave te beschouwen als een gezamenlijke opgave.
4. Koppeling van duurzame opwek aan andere ruimtelijke opgaven (natuur, landbouw, woningbouw) voor integraal voordeel.
5. Structurele betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij ontwikkeling en draagvlak.

Conclusie

Het doel van 1,6 TWh is haalbaar met een gezamenlijke inspanning. Dit moment vraagt om een volgende stap in de versterking van vertrouwen en onderlinge samenwerking tussen alle leden van de Energietafel, ook met het oog op de opgave richting 2050.

Oproep aan bestuurders

Bent u bereid actief bij te dragen aan het realiseren van kansrijke projecten zodat we gezamenlijk het doel van 1,6 TWh bereiken? De Energietafel wordt commitment gevraagd om projecten van “ambitie” naar “pijplijn” te brengen en samen te werken, ook wanneer de inspanning per partij verschilt.
